KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
SATUAN TUGAS ANTISIPASI & PENANGANAN EL NINO

LAPORAN
SATUAN TUGAS ANTISIPASI & PENANGANAN
DAMPAK EL NINO

PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Status : 19 Oktober 2026

SATUAN TUGAS ANTISIPASI & PENANGANAN DAMPAK EL NINO PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

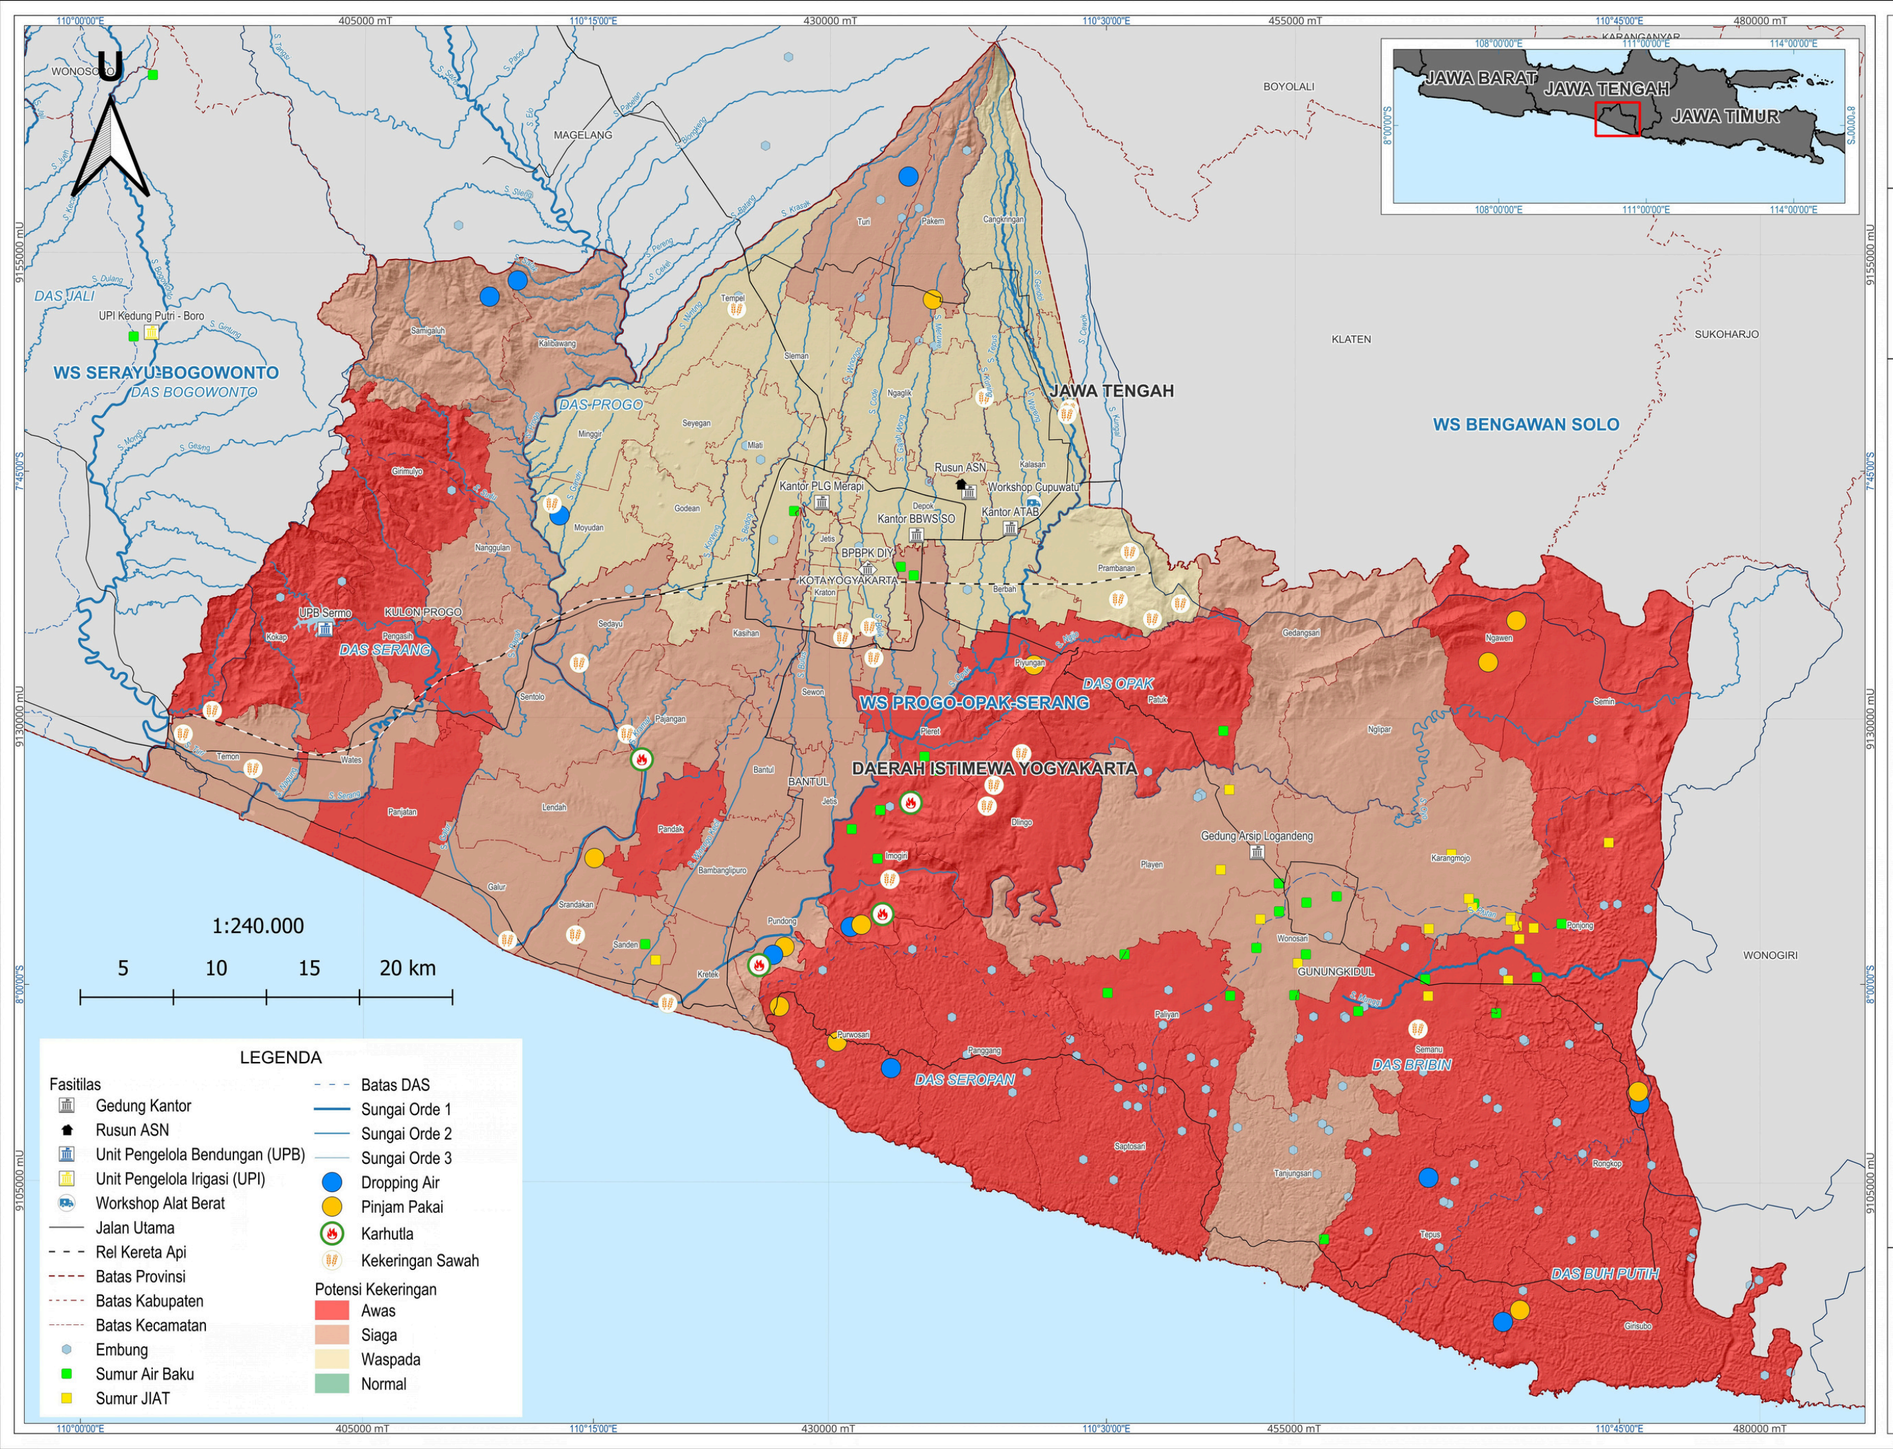

KEMENPU

SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

REKAPITULASI PENANGANAN KEKERINGAN

SATUAN TUGAS MITIGASI DAN PENANGANAN EL NINO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STATUS SIAGA

- Daerah Istimewa Yogyakarta efektif **20 Juli - 30 September 2026 (Diperpanjang)**
- Kabupaten Sleman efektif **1 September - 30 November 2026**
- Kabupaten Gunungkidul efektif **1 Juni - 30 Agustus 2026**
- Kabupaten Bantul efektif **25 Juni - 25 September 2026**
- Kabupaten Kulon Progo efektif **27 Juli - 30 September 2026**

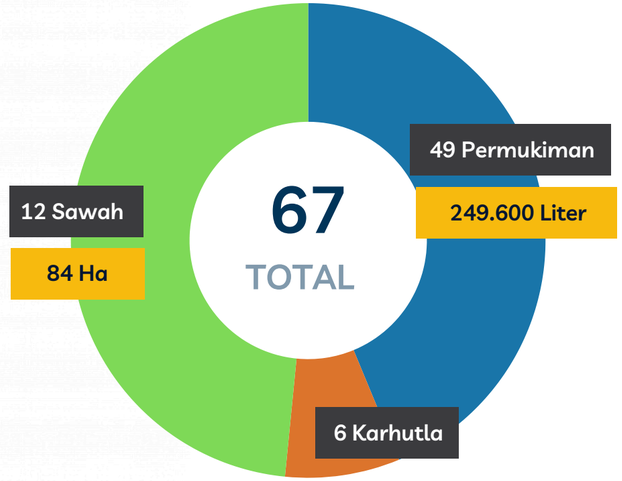

30 PENANGANAN

37 PENANGANAN

BBWS SERAYU OPAK
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BPBPK D.I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

OVERVIEW PENANGANAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

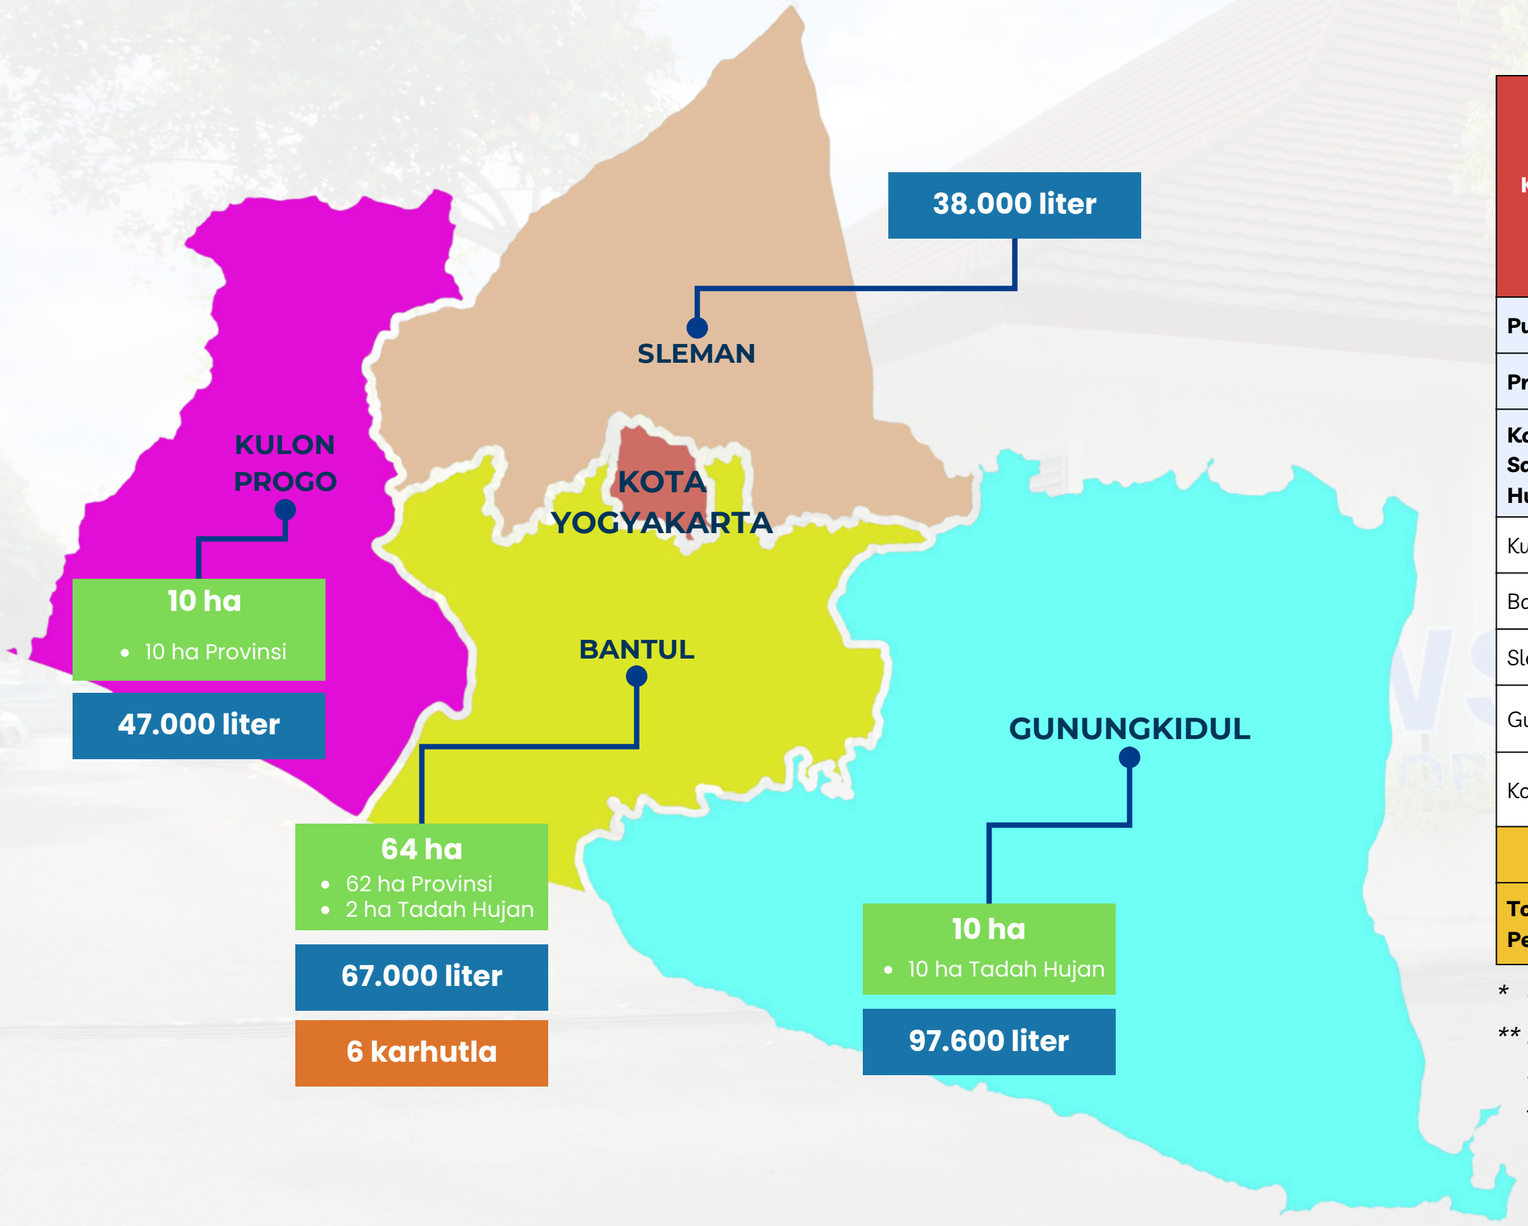

PENANGANAN & MONITORING KEKERINGAN SAWAH

Kewenangan	Penanganan			Rencana Penanganan / Lainnya*	Total Monitoring*
	Normalisasi Saluran Irigasi *	Pemompaan Air dari Sungai ke Sawah *	Penanganan Sungai (Intake/ Outlet Drain)		
Pusat	**0**	**0**	**0**	**119,5**	**119,5**
Provinsi	**10**	**0**	**62**	**407**	**479**
Kabupaten & Sawah Tadah Hujan	**0**	**10**	**2**	**391**	**403**
Kulon Progo	0	0	0	34	
Bantul	0	0	2	105,1	
Sleman	0	0	0	233,9	
Gunungkidul	0	10	0	17	
Kota Yogyakarta	0	0	0	1	
	10	**10**	**64**	**917,5**	**1001,5**
Total Penanganan	**84**				

* *dalam hektar*

** *monitoring adalah 2 lokasi (14 ha) luasan yang telah ditangani sebelumnya*

Penambahan Penanganan
19 Oktober 2026
2 Monitoring**
14 ha**

PENANGANAN KEKERINGAN BBWS SERAYU OPAK

WRDC CODE: SDA-2026-4483

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

01 Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta

Koordinat: -7.8487623398, 110.380302675

STATUS: 19 OKTOBER 2026

A Deskripsi Kejadian Kekeringan

- Survei kali ini merupakan Tindak Lanjut dari survei tanggal 18 Oktober 2026.
- Luas area yang terdampak 12 Ha (daerah Malangjiwan, Bakung, Tibayan, Mranggen).
- Termasuk Daerah Irigasi Malangjiwan.
- Tanggal 7 Oktober 2026 telah dikirim 200 geobag.
- P3A Sedyo Makmur.
- Lokasi kegiatan Bendung Malangjiwan.

Mobilisasi Excavator Kobelco SK 50

Pengisian Geobag

B Deskripsi Penanganan Kekeringan

Hasil Monev Tindak Lanjut:

- Hari ini dilakukan kerja bakti antara Tim Satker Bendungan & Tim Alat Berat Cupuwatu, dan warga setempat di lokasi Bendungan Malangjiwan.
- Pekerjaan yang dilaksanakan berupa mobilisasi Excavator Kobelco SK 50 milik BBWS Serayu Opak.
- pembukaan area kerja ekskavator untuk pengisian geobag.
- pengisian Geobag.
- pembuatan dan pemasangan turap bambu

Peta Area Layanan

Pemasangan turap trucuk bambu

Pembukaan lahan untuk persiapan pemasangan geobag

Contact Person: Dian Kurnjawan - Pengadministrasian Perkantoran (+62895406004040)

PENANGANAN KEKERINGAN BBWS SERAYU OPAK

WRDC CODE: SDA-2026-5836

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

02 **Desa/ Kelurahan: Lemah Rubuh, Kecamatan: Imogiri, Kabupaten: Bantul, Prov. : D.I. Yogyakarta**

Koordinat: -7.944848, 110.408732

STATUS: 19 OKTOBER 2026

A Deskripsi Kejadian Kekeringan

- Survei kali ini merupakan Tindak Lanjut dari survei tanggal 17 Oktober 2026, yaitu penyelamatan lahan persawahan warga yang longsor.
- Luas area yang terdampak 2 Ha.
- Area lokasi usulan merupakan lahan persawahan yang mengalami longsor akibat banjir yang terjadi saat Badai Cempaka pada tahun 2017.
- Kondisi alur sungai eksisting yang berada di sisi kiri bagian luar turut menyebabkan terjadinya longsor susulan.

Kondisi Lapangan yang sudah dikeruk

Kondisi Dungai

B Deskripsi Penanganan Kekeringan

Hasil Monev Tindak lanjut:

- Mengalihkan aliran sungai dari sisi luar menuju ke bagian tengah sungai untuk mengurangi potensi erosi dan longsor pada tebing sungai.
- Pekerjaan yang dilaksanakan dengan PC 200 1 unit milik BBWS Serayu Opak.
- Menata sedimen di sisi kanan dan kiri sungai sebagai upaya perlindungan terhadap tanggul sungai.

Peta Area Layanan

Monev Pengerukan tebing sungai

Monev Pengerukan tebing sungai

Contact Person: Sri Aditya Kuncoroyakti - Jafung Perencana Ahli Pertama (08174105459)

PENANGANAN KEKERINGAN PEMUKIMAN

Jenis Penanganan	Jumlah Penduduk Terdampak	Air Terdistribusi
Distribusi Air Bersih	15.168 Jiwa	249.600 liter

Penambahan Pengiriman
19 Oktober 2026

0 Lokasi

0 liter

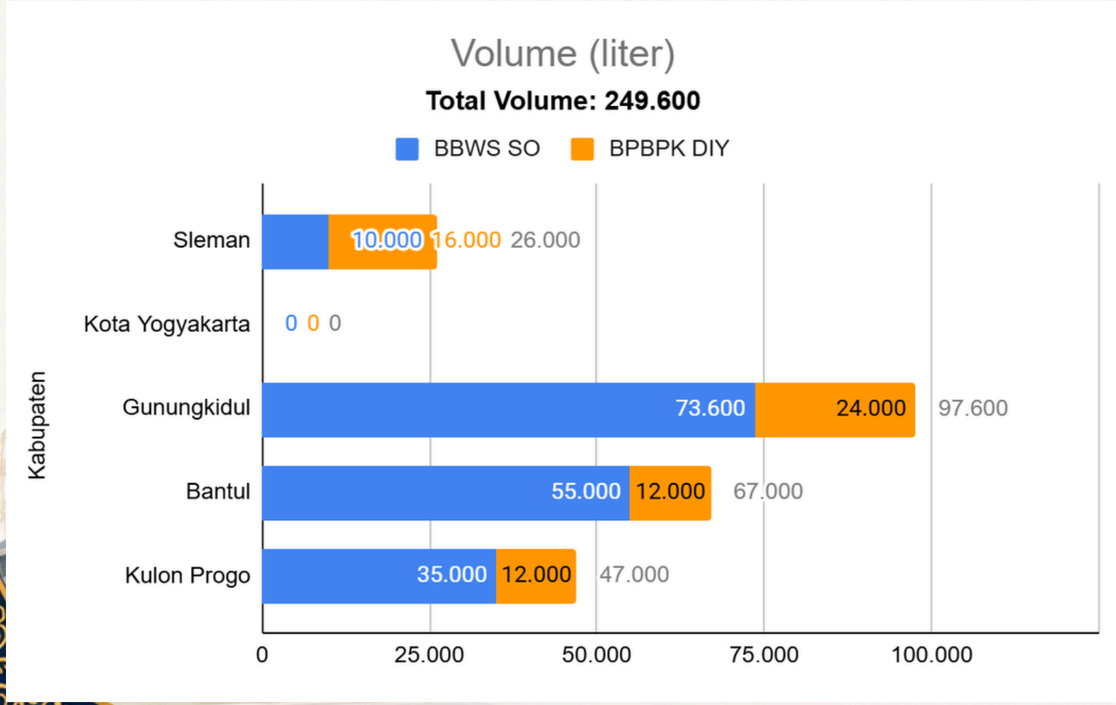

PENANGANAN KEKERINGAN KARHUTLA

Jumlah Kejadian	On Progress	Selesai
6	0	6

Penambahan Kejadian
19 Oktober 2026

0 Kejadian

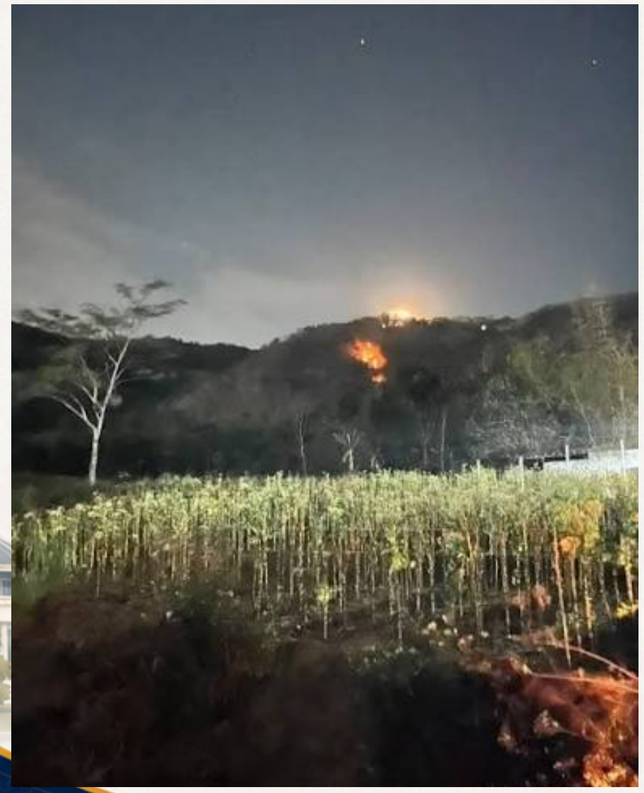

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

RINCIAN KESIAPAN PERALATAN PENANGANAN DAMPAK EL NINO

Provinsi D.I. Yogyakarta

BBWS SERAYU OPAK
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Jenis Peralatan	Jumlah
Mobil pompa KSB (250 l/dt)	1 unit
Pompa air potable (60 m3/h)	40 unit
Mobil Pompa Air CAMADA (B 9158 DQ) (500 l/dt)	1 unit
Mobil Tangki Air Kapasitas 4000 Liter	1 unit
Pompa dan Genset Portable Duduk	7 unit

BPBPK D.I. YOGYAKARTA
Direktorat Jenderal Cipta Karya

Jl. Pangeran Mangkubumi No. 128, Yogyakarta

Kendaraan Angkut
(6 jenis · 1 unit)

Jenis Peralatan	Jumlah
Dump Truck	1 unit
Mobil Double Cabin	1 unit
Mobil Toilet Cabin	2 unit
Mobil Tangki Air	7 unit
Truk Angkut	1 unit
Genset Listrik 5000 Watt	1 unit

Pompa dan Kelengkapan
(3 jenis · 1 unit)

Jenis Peralatan	Jumlah
Pompa Air	1 unit
Gergaji Mesin	1 unit
Hidran Umum (HU)	135 unit

Penyediaan Air Bersih
(6 jenis · 137 unit)

Jenis Peralatan	Jumlah
Pondasi HU	45 unit
WC Portable	13 unit
Septic Tank	7 unit
Velbed	12 unit
Pipa HDPE dia 2"	15 unit

Tenda dan Sarana Darurat
(2 jenis · 6 unit)

Jenis Peralatan	Jumlah
Tenda Komando	3 unit
Tenda Hunian Darurat	3 unit

TANGGAP CEPAT | KOLABORATIF | BERKELANJUTAN

KEMENPU
SIGAP MEMBANGUN NEGERI UNTUK RAKYAT

TERIMA KASIH

BALAI PENGELOLA SDA

BBWS Serayu Opak

Jl. Solo Km. 6, Yogyakarta 55281

CALL CENTER · WHATSAPP · 24 JAM

0852-9050-0905

NARAHUBUNG CIPTA KARYA

Dian Islamiyah, S.T., M.T.

Penanggung Jawab Provinsi D.I. Yogyakarta

KONTAK · WHATSAPP · 24 JAM

081332736452

Cari | Temukan | Eksekusi
